

山丹县县级体育足球场建设项目

绩效评价报告

（一般公共预算）

项 目 名 称： 山丹县县级体育足球场建设项目

项目实施机构： 山丹县文体广电和旅游局

项目主管部门： 山丹县文体广电和旅游局

评价实施部门： 山丹县财政局

评价机构名称： 甘肃慧瑞融智管理咨询有限公司

2025 年 8 月



山丹县县级体育足球场建设项目绩效评价结论表

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	山丹县县级体育足球场建设项目		
	评价年度	2024 年	评价类型	财政评价
	委托评价单位	山丹县财政局	评价机构名称	甘肃慧瑞融智管理咨询有限公司
	评价对象名称	山丹县县级体育足球场		
评价目的	本次绩效评价旨在紧密围绕山丹县县级足球场建设项目的实施特点，以项目本身为核心切入点，重点剖析项目在补齐县域公共体育设施短板、满足群众健身需求、助力“西部旅游名县”创建等总体目标。通过深入核查 2023 年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资政策落实情况、项目实施全流程规范性、240 万元资金使用合规性与效率，以及足球场主体建设、配套设施安装、前期服务等项目内容的完成进度与质量，精准识别项目执行过程中存在的潜在问题。针对部分管理制度落地细节待优化等问题进行深度分析，提出细化制度执行流程等具有针对性与实操性的改进建议，切实提升中央基建投资资金使用效率与效益，推动项目运营维护优化，为山丹县后续公共体育设施建设、全民健身事业发展提供科学决策依据与实践指导。			
资金情况 (万元)	预算安排资金	240 万元	实际到位资金	240 万元
	其中：中央财政	240 万元	其中：中央财政	240 万元
	省级财政	0	省级财政	0
	实际支出资金	240 万元	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		
二、绩效目标				
年度目标	以 2023 年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资为支撑，旨在补齐山丹县公共体育设施短板，完善城市体育服务功能。通过新建 1 块 7140 平方米标准 11 人制草坪足球场及配套给排水、电气、照明、监控等设施，构建“专业场地+配套服务”的公共体育服务体系，满足群众足球运动与日常健身需求；推动全民健身国家战略在县域落地，提升城市体育服务能力与品位，助力“西部旅游名县”创建；形成体育设施长效管理机制，实现体育与社会、经济、生态效益协同，为山丹县体育事业长期均衡发展、构			

	建全民健身体系提供坚实保障。
三、评价基本情况	
评价范围	时间范围：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 对象范围：山丹县县级体育足球场建设项目 资金范围：240 万元
评价依据	1. 绩效管理文件 (1) 《中华人民共和国预算法》； (2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）； (3) 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）； (4) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）； (5) 《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）； (6) 《甘肃省财政厅关于贯彻落实〈中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（甘财绩〔2019〕6 号）； (7) 《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）； (8) 《中共张掖市委 张掖市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市委发〔2019〕19 号）； (9) 《中共山丹县委办公室 山丹县人民政府办公室印发关于〈全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（县委办发〔2019〕97 号） 2. 项目业务文件 (1) 《甘肃省财政厅关于下达 2023 年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算的通知》（甘财建〔2023〕161 号）； (2) 资金支出台账、国库集中支付凭证等； (3) 财务管理制度、项目管理流程； (4) 项目招投标文件、中标通知书以及招标代理、设计、评审、施工、监理等合同； (5) 竣工总结报告、监理总结报告、初步验收书。

绩效评价指标体系	本次评价从决策、过程、成本、产出、效益 5 个维度综合分析，评价 2024 年山丹县县级足球场建设项目的绩效情况。5 个一级指标之下包含 12 个二级指标和 24 个三级指标。						
评价办法	(1) 比较法 (2) 因素分析法 (3) 公众评判法						
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取文本收集、现场调研、深度访谈、问卷调查等方式进行数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。						
绩效评价工作过程	1. 前期准备阶段：调研收资、设计评价指标 2. 组织实施阶段：核资、现场评价、非现场评价、形成初步结论及评分 3. 报告撰写和提交阶段：撰写初稿、论证修改、提交终稿 (2025 年 8 月 4 日-2025 年 8 月 25 日)						
四、评价结论和绩效分析							
综合评价结论	评价得分	90		评价等级		优	
绩效分析	指标	决策	过程	成本	产出	效益	合计
	得分率	100%	71%	100%	100.00%	83%	90%
五、存在问题		(一) 项目未制定实施方案，执行环节缺少指引 经核查，山丹县县级足球场建设项目未按要求制定包含目标定位、实施步骤、责任分工、阶段划分及进度安排等核心内容的实施方案。该项目涉及场地建设、配套设施安装、材料采购、质量管控、验收组织等多个关键环节，因缺乏完备方案，项目推进失去基础指引，实施规范性与可控性不足。 (二) 临时管理维护制度缺失 经核查，该项目位于山丹县工业遗址主题公园，因公园暂未完成建设验收，项目整体未制定长效管理机制。但足球场已建成并具备使用条件，却未针对性建立临时管理维护制度，存在临时责任主体未明确、临时维护内容未规定、临时开放规则未制定的问题，且未预留与后续公园整体管理机制的衔接接口，易导致足球场运维缺失、使用无序，影响公共服务功能发挥。					

六、有关对策建议	(一)补全项目实施方案相关材料，建立方案管控与长效预防机制 针对山丹县县级足球场建设项目未制定实施方案，导致执行无指引、进度与环节管控存在风险的问题，一是建议建设单位牵头，联合施工、监理、勘察、设计等参建单位，梳理项目已完成的场地建设、材料采购、质量验收等实际流程，追溯各环节的执行细节，明确无方案情况下易出现的衔接漏洞与管控盲区，形成“无方案实施问题台账”，详细记录问题表现、影响及改进方向，为后续同类体育场地项目提供参考依据；二是建议建设单位对照项目规划要求，对项目实际建设成果及资金使用情况开展专项复盘评估；同时完善县域基建项目管理制度，明确要求今后新建体育场地、公共设施类项目，必须在开工前制定包含目标定位、实施步骤、责任分工、进度安排及管控标准的完整实施方案，方案需经建设、监理、设计单位联合审核通过后方可实施，并将方案执行情况与项目绩效评价挂钩，从制度层面杜绝“无方案施工”“边实施边规划”的情况，保障项目规范高效推进。 (二)制定足球场临时维护与公园衔接方案 该项目位于山丹县工业遗址主题公园、公园未验收导致未制定整体管理机制的情况，建议优先由山丹县文体广电和旅游局牵头，联合公园建设单位，为足球场单独建立临时管理维护制度：明确临时管理责任主体，界定临时维护内容，规范临时开放规则；同时在临时制度中预留与后续公园整体管理机制的衔接条款，待公园验收后，可平稳过渡至公园统一管理体系，避免因管理断层导致足球场运维缺失，保障其持续服务群众健身需求。
七、其他需要说明的事项	无
1. 本次绩效评价所需资料均由山丹县文体广电和旅游局相关工作人员提供。 2. 本次绩效评价涉及的金额均保留两位小数。	
评价机构（盖章）： 主评人（签字）： 评价日期：2025年8月25日	评价工作组人员（签字）： 柳阳娇 梁翔 百翔AA 王腊梅 张洁 评价日期：2025年8月25日
附：项目主评人绩效评价师资质证书	



绩效评价师

持证人参加北京国家会计学院绩效评价师CPEP能力水平考核，成绩合格，具备了绩效评价专业知识及能力，特发此证。

姓名：李进军 性别：男

身份证号：620105196402291016

项目名称：绩效评价师

证书编号：NAI2022CPEP0067

院长：

签发单位：北京国家会计学院

签发日期：2022年6月24日



摘 要

一、项目基本情况

为推进全民健身设施补短板工程，落实公共体育服务建设要求，甘肃省财政厅印发《甘肃省财政厅关于下达 2023 年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算的通知》（甘财建〔2023〕161 号），明确山丹县县级足球场建设项目分配资金 240 万元，用于新建标准 11 人制草坪足球场及配套附属设施建设内容，项目规划建设 1 块标准 11 人制草坪足球场及配套设施。

2024 年 2 月，山丹县文体广电和旅游局委托相关单位开展项目实施方案设计与评审工作，2021 年 2 月 8 日，山丹县发展和改革局批复《山丹县县级足球场建设项目可行性研究报告》，方案明确建设内容为 7140 平方米足球场及附属设施，涵盖场地平整、人工草坪铺设、天然砂砾与混凝土基层施工、排水沟修建、砖检查井安装、电力电缆敷设、监控与照明设备安装等工程，旨在完善公共体育设施，满足群众健身需求。

二、项目预算安排和支出情况

根据《甘肃省财政厅 甘肃省体育局关于下达 2023 年中央转移支付全民健身设施补短板（县级足球场建设）补助资金的通知》（甘财建〔2023〕161 号），2024 年度山丹县县级足球场建设项目总预算资金为 240 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金已全额到位，为足球场主体建设及配套设施施工提供了稳定资金支撑，保障项目有序推进。在资金使用方面，已累计支出 240 万元，资金使用率达 100%。其中，足球场建设工程款支出 235.6 万元，完成标准 11 人制草坪足球场主体及配套排水沟、雨水管建设；项目勘察费支出 3.8 万元，完成场地前期勘察测绘并出具测绘报告；履约保函保险费支出 1499.85 元，保障工程款支付环节合规；县级足球场建设项目施工图审费支出 4500 元，完成项目施工图审查工作，确保施工图纸符合建设规范与项目设计要求等。各项支出均对应项目建设关键环节，资金使用与项目实施需求精准匹配，保障了足球场建设任务顺利完成。

三、绩效评价工作开展情况

评价组从以下三个方面开展评价工作：一是对项目资料和财务资料进行全面梳理，重点分析山丹县县级足球场建设项目实施依据充分性、立项程序规范性、项目目标合理性、预算编制科学性等内容；二是通过工程计量报审表、工程款支付申请、财政授权支付凭证、记账凭证等资料核查，结合《项目管理制度》《财务管理制度》等条款，重点分析项目过程中的资金使用合规性、制度执行有效性、采购管理规范性、合同管理完备性以及项目验收规范性等问题；三是依据《项目绩效目标申报表》《2024 年度

绩效自评报告》，设置涵盖产出、效益、满意度的项目绩效评价指标体系，全面分析项目具体落实情况、成果产出情况及产生的效益情况。评价组按照指标体系对项目情况进行汇总分析，形成绩效评价报告。

四、综合评价结论

经综合评价与分析，2024 年山丹县县级足球场建设项目绩效评价最终得分为 **90** 分，评价结果为“**优**”。

五、存在的问题

（一）项目未制定实施方案，执行环节缺少指引

经核查，山丹县县级足球场建设项目未按要求制定包含目标定位、实施步骤、责任分工、阶段划分及进度安排等核心内容的实施方案。该项目涉及场地建设、配套设施安装、材料采购、质量管控、验收组织等多个关键环节，因缺乏完备方案，项目推进失去基础指引，实施规范性与可控性不足。

（二）临时管理维护制度缺失

经核查，该项目位于山丹县工业遗址主题公园，因公园暂未完成建设验收，项目整体未制定长效管理机制。但足球场已建成并具备使用条件，却未针对性建立临时管理维护制度，存在临时责任主体未明确、临时维护内容未规定、临时开放规则未制定的问题，且未预留与后续公园整体管理机制的衔接接口，易导致足球场运维缺失、使用无

序，影响公共服务功能发挥。

六、相关建议

（一）补全项目实施方案相关材料，建立方案管控与长效预防机制

针对山丹县县级足球场建设项目未制定实施方案，导致执行无指引、进度与环节管控存在风险的问题，一是建议建设单位牵头，联合施工、监理、勘察、设计等参建单位，梳理项目已完成的场地建设、材料采购、质量验收等实际流程，追溯各环节的执行细节，明确无方案情况下易出现的衔接漏洞与管控盲区，形成“无方案实施问题台账”，详细记录问题表现、影响及改进方向，为后续同类体育场地项目提供参考依据；二是建议建设单位对照项目规划要求，对项目实际建设成果及资金使用情况开展专项复盘评估；同时完善县域基建项目管理制度，明确要求今后新建体育场地、公共设施类项目，必须在开工前制定包含目标定位、实施步骤、责任分工、进度安排及管控标准的完整实施方案，方案需经建设、监理、设计单位联合审核通过后方可实施，并将方案执行情况与项目绩效评价挂钩，从制度层面杜绝“无方案施工”“边实施边规划”的情况，保障项目规范高效推进。

（二）制定足球场临时维护与公园衔接方案

该项目位于山丹县工业遗址主题公园、公园未验收导

致未制定整体管理机制的情况，建议优先由山丹县文体广电和旅游局牵头，联合公园建设单位，为足球场单独建立临时管理维护制度：明确临时管理责任主体，界定临时维护内容，规范临时开放规则；同时在临时制度中预留与后续公园整体管理机制的衔接条款，待公园验收后，可平稳过渡至公园统一管理体系，避免因管理断层导致足球场运维缺失，保障其持续服务群众健身需求。

目 录

一、项目基本情况	9
(一) 项目立项背景	9
(二) 项目预算安排及使用情况	10
(三) 项目计划内容及实施情况	10
(四) 项目组织管理	13
二、项目绩效目标	15
三、评价基本情况	16
(一) 评价目的	16
(二) 评价对象与范围	17
(三) 评价依据	17
(四) 评价原则及评价方法	19
(五) 绩效评价指标框架	20
(六) 评价人员组成	21
(七) 绩效评价工作过程	22
四、评价结论及分析	24
(一) 评价结论	24
(二) 综合评价情况分析	26
五、绩效评价指标分析	26
(一) 项目决策情况	27
(二) 项目过程情况	30

(三) 项目成本情况	34
(四) 项目产出情况	34
(五) 项目效益情况	37
六、项目主要经验及做法	38
七、存在的问题及原因分析	39
八、相关建议	40
九、需要说明的问题	41
附件 1: 项目支出绩效评价评分表	42
附件 2: 项目问题清单	57
附件 3: 满意度调查问卷	58
(一) 调查目的及对象	58
(二) 调查问卷	58
(三) 满意度调查问卷填报数据	61
(四) 满意度调查结果分析	63

山丹县县级体育足球场建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为深入贯彻落实《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中“将全民健身上升为国家战略”的工作要求，响应《中国足球中长期发展规划（2016-2050年）》中“每个县级行政区域至少建有2个社会标准足球场地”的部署，持续完善公共体育服务设施，根据《甘肃省财政厅关于下达2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算的通知》（甘财建〔2023〕161号）文件精神，中央财政下达专项资金240万元，用于支持山丹县开展县级足球场建设，以补齐县域社会体育场地短板，提升公共体育服务保障能力。

山丹县作为推进“西部旅游名县”创建的重点区域，此前存在群众体育基础设施薄弱问题：县域内标准化足球场地匮乏，现有体育设施难以满足群众尤其是青少年足球运动需求；原清水水泥厂区域（规划五彩山丹体育公园内）缺乏统筹规划的体育活动空间，且无专业足球场承接体育赛事活动。同时，山丹县群众体育健身意识逐步增强，但体育场地面积不足、功能单一等问题，已成为制约全民健身活动开展、影响城市品位提升的重要因素，亟须通过新

建标准化足球场改善现状。

根据上级部署，山丹县规划在原清泉水泥厂内新建1块标准11人制草坪足球场（占地面积7140平方米）及配套设施（含排水沟、检查井、照明系统、给排水系统、电气工程等），通过场地平整、人工草坪铺设、基础设施安装等工程，补齐公共体育设施短板，旨在为群众提供安全、专业的健身场地，增强群众体育参与获得感，助力“西部旅游名县”创建，推动县域体育事业与旅游产业融合发展。

（二）项目预算安排及使用情况

1. 项目预算安排

山丹县县级足球场建设项目总投资240万元，资金来源是《甘肃省财政厅关于下达2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算的通知》（甘财建〔2023〕161号），中2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算资金240.00万元。

2. 资金使用情况

截至2024年12月31日，依据记账凭证、财政授权支付凭证等资料，项目累计实际支出240万元。其中，中央基建投资预算资金240万元已全额使用，预算执行率为100%。

（三）项目计划内容及实施情况

1. 项目计划内容

山丹县县级足球场建设项目计划在山丹县清泉镇原清泉水泥厂内（规划五彩山丹体育公园内）新建1块标准11

人制草坪足球场及配套附属设施,总占地面积 7140 平方米,具体计划内容如下:

核心工程(足球场主体):计划建设长 105 米、宽 68 米标准 11 人制场地,包含 250mm 厚天然级配砂基层+200mm 厚 C25 混凝土垫层施工,铺设 50 厚 PE 人工草坪(面积 7643.6 m^2),场地内按国际标准划分球门区、罚球区、中圈区等功能区域,设置 7.32 米 $\times$ 2.44 米标准球门。

土建配套工程:计划修建运动场内排水沟 361.88 米(钢筋混凝土结构,配 600 $\times$ 380 铸铁篦子)、砖检查井 4 座(800 $\times$ 1200mm,带铸铁井盖),完成场地平整(7839.28 m^2)、挖一般土方(3924 m^3)及原土夯回填(504.01 m^3),配套路灯基础(7.95 m^3)及零星钢构件(预埋铁件及螺栓 0.679t)。

给排水工程:计划铺设 DN300HDPE 双壁波纹管排水管 310.26 米,挖沟槽土方(三类土,深度 1.2 米)552.88 m^3 ,设置 175mm 厚中粗砂褥垫层 48.87 m^3 ,构建雨污合流排水系统,接入市政排水管网。

电气工程:计划敷设电力电缆(WDZYJE5 $\times$ 16)79.2 米、控制电缆(YJV1KV5 $\times$ 6)301.6 米,安装高杆照明灯 4 套(35 米高,3 $\times$ 350W 金属卤化物光源)、足球场照明箱 1 台,配套 4 台带云台彩色摄像机、1 套 LED 显示屏及广播扬声器(150W 壁挂)4 个,设置接地极(镀锌角钢 $\angle$ 50 $\times$ 50 $\times$ 5)8 根,确保接地电阻 $\leq 4\Omega$ 。

其他配套:计划投入安全文明施工费(含围挡、护栏、

扬尘防治等)80584.72元,购置1副足球门(预算5000元),同步开展施工图审查、项目勘察等前期工作。

2. 项目实施情况

依据工程计量报审表、已完工工程量清单、财政支付凭证及项目自评报告,该项目于2024年3月开工,2024年6月竣工,总工期120日历天,各分项工程实施情况如下:

核心工程(足球场主体):已完成7140平方米场地整体建设,天然级配砂基层、C25混凝土垫层及50厚PE人工草坪(7643.6 m²)均按计划铺设,场地标线(边线、端线、球门区等)规范划分,标准球门已安装到位,符合国际11人制足球场标准。

土建配套工程:已完成361.88米排水沟及4座砖检查井修建,场地平整、土方开挖及回填全部完工,路灯基础(7.95m³)及零星钢构件(0.679t)安装完成,电缆沟、地沟模板(558.21 m²)及路灯基础模板(30.08 m²)施工达标。

给排水工程:DN300HDPE双壁波纹管排水管(310.26米)已铺设完成,沟槽开挖、砂褥垫层及回填工程全部竣工,排水系统经闭水试验合格,顺利接入市政管网。

电气工程:电力电缆、控制电缆敷设完成,4套高杆照明灯、照明箱、监控设备(4台摄像机)、LED显示屏及广播系统均安装调试到位,接地系统检测合格,满足使用需求。

其他配套：安全文明施工措施（围挡、扬尘防治等）已落实，1 副足球门已购置，项目勘察（中远智信设计有限公司河西分公司）、施工图审查（中国市政工程西北设计研究院有限公司）等前期工作已完成，累计支付勘察费 3.8 万元、施工图审费 0.45 万元，工程整体于 2024 年 6 月通过竣工验收，已投入使用。

（四）项目组织管理

1. 项目组织管理主体

（1）山丹县财政局：资金拨付与监管单位。负责项目中央基建投资预算的预算管理、资金拨付与监管工作，严格执行国库集中支付制度，审核资金支付申请，确保资金专款专用、及时足额拨付至施工单位或服务提供方，同时开展预算执行监控，保障资金使用合规性。

（2）山丹县文体广电和旅游局：项目主管部门及实施单位。负责项目全流程管理，包括组织项目前期论证、可行性研究报告编制与申报、施工图审查委托、施工单位招标；严格按审批要求组织建设，规范资金使用，及时上报项目进度与绩效情况；牵头项目验收，联合监理单位核查工程质量与工程量，确保项目达标。

2. 项目实施流程

根据《甘肃省财政厅关于下达 2023 年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算的通知》（甘财建〔2023〕161 号）及项目管理制度、可行性研究报告批复等文件要求，

项目按“申报立项-实施管理-验收管理-监督管理”四流程实施：

（1）项目申报立项：山丹县文体广电和旅游局依据中央全民健身设施补短板工程政策及省级资金文件精神，申报县级足球场建设项目，申请 2023 年第二批中央基建投资 240 万元，用于原清泉水泥厂内新建 7140 平方米标准 11 人制草坪足球场及配套设施（排水沟、电气工程等），解决县域标准化足球场地匮乏问题；项目获山丹县发改委批复（山发改〔2021〕19 号），明确建设规模、投资与工期。

（2）项目实施管理：山丹县文体广电和旅游局委托中远智信设计有限公司河西分公司开展项目勘察、中国市政工程西北设计研究院有限公司开展施工图审查，分别签订服务合同；通过招标确定陕西圣奥祥业建设工程有限公司为施工单位，签订《建设工程施工合同》，明确建设内容、建设时间；资金按工程进度支付。

（3）项目验收管理：项目竣工后，山丹县文体广电和旅游局联合监理单位，依据已完工工程量清单，核查工程质量、工程量完成情况及资金使用合规性，确保与项目实施方案一致；验收合格后出具验收报告，项目正式投入使用。

（4）监督管理：山丹县文体广电和旅游局严格执行项目法人责任制、招投标制、监理制与合同制，通过监理日志、现场巡查监管施工过程；项目预算、招标结果、资金

支付等信息按要求公开，接受社会监督；同时开展绩效监控与自评，跟踪资金使用效益与群众满意度，确保项目实现全民健身服务目标。

3. 资金拨付流程

根据财政授权支付凭证、记账凭证及资金管理文件，项目资金拨付流程如下：

（1）资金下达：甘肃省财政厅依据《甘财建〔2023〕161号》文件，向山丹县财政局下达中央基建投资240万元，专项用于县级足球场建设。

（2）进度申请：施工单位按施工合同约定完成对应工程后，提交《工程款支付申请》及佐证材料，经监理单位核验工程量与工程质量，出具核定意见后报送山丹县文体广电和旅游局。

（3）审核确认：山丹县文体广电和旅游局审核施工单位申请材料，核对工程进度与合同约定一致性、发票合规性后，明确支付金额、收款账户。

（4）资金拨付：山丹县文体广电和旅游局通过国库集中支付系统，将工程款直接拨付至施工单位账户，同时完成财务核算。

二、项目绩效目标

以2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资为支撑，旨在补齐山丹县公共体育设施短板，完善城市

体育服务功能。通过新建 1 块 7140 平方米标准 11 人制草坪足球场及配套给排水、电气、照明、监控等设施，构建“专业场地+配套服务”的公共体育服务体系，满足群众足球运动与日常健身需求；推动全民健身国家战略在县域落地，提升城市体育服务能力与品位，助力“西部旅游名县”创建；形成体育设施长效管理机制，实现体育与社会、经济、生态效益协同，为山丹县体育事业长期均衡发展、构建全民健身体系提供坚实保障。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价旨在紧密围绕山丹县县级足球场建设项目的实施特点，以项目本身为核心切入点，重点剖析项目在补齐县域公共体育设施短板、满足群众健身需求、助力“西部旅游名县”创建等总体目标。通过深入核查 2023 年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资政策落实情况、项目实施全流程规范性、240 万元资金使用合规性与效率，以及足球场主体建设、配套设施安装、前期服务等项目内容的完成进度与质量，精准识别项目执行过程中存在的潜在问题。针对部分管理制度落地细节待优化等问题进行深度分析，提出细化制度执行流程等具有针对性与实操性的改进建议，切实提升中央基建投资资金使用效率与效益，推动项目运营维护优化，为山丹县后续公共体育设施

建设、全民健身事业发展提供科学决策依据与实践指导。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

本次绩效评价对象为山丹县文体广电和旅游局 2023 年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算资金 240 万元。

2. 评价范围

（1）评价时间范围

评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（2）评价内容范围

评价范围涵盖项目实施全流程及 240 万元中央基建投资资金使用各环节。包括项目前期依据省级文件要求的筹备与审批情况；施工建设阶段的招标流程、工程计量核验、分项工程实施；前期服务阶段的勘察、施工图审查组织实施与费用支付；以及项目验收阶段的自评与工程质量核查等实施内容。同时，对 240 万元中央基建投资资金的下达、分配、使用审批、支付流程进行全面核查，评估资金使用的合规性、效率与效益，确保完整覆盖项目政策落实、执行过程及成果产出等关键领域。

（三）评价依据

1. 绩效管理文件

（1）《中华人民共和国预算法》；

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

(3) 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号);

(4) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号);

(5) 《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号);

(6) 《甘肃省财政厅关于贯彻落实〈中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》(甘财绩〔2019〕6号);

(7) 《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》(甘财绩〔2020〕5号);

(8) 《中共张掖市委 张掖市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(市委发〔2019〕19号);

(9) 《中共山丹县委办公室 山丹县人民政府办公室印发关于〈全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》(县委办发〔2019〕97号)

2. 项目业务文件

(1) 《甘肃省财政厅关于下达 2023 年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算的通知》(甘财建

〔2023〕161号）；

（2）资金支出台账、国库集中支付凭证等；

（3）财务管理制度、项目管理流程；

（4）项目招投标文件、中标通知书以及招标代理、设计、评审、施工、监理等合同；

（5）竣工总结报告、监理总结报告、初步验收书。

（四）评价原则及评价方法

1. 评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

（1）**科学规范**。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）**绩效相关**。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）**客观公正**。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求。

2. 评价方法

（1）比较法

通过对山丹县县级体育足球场建设项目实际完成内容与计划目标任务进行对比分析，在此基础上采用定量与定性相结合的方式对比分析。

（2）因素分析法

通过对影响山丹县县级足球场建设项目绩效目标实现和实施效果的内外部因素进行综合分析，以此来客观地评

价项目实施情况和效益发挥情况，为以后全民健身设施补短板工程（县级足球场建设类）项目的规范实施积累成熟的经验和做法。

（3）公众评判法

通过对山丹县县级足球场建设项目涉及的人民群众以调查问卷方式开展满意度调查，全面了解人民群众对项目实施后的满意度情况。

（五）绩效评价指标框架

根据《中共山丹县委办公室 山丹县人民政府办公室印发关于<全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》（县委办发〔2019〕97号）的相关要求，结合本项目的实际情况，在深入分析绩效目标申报表的基础上，制定2024年山丹县县级足球场建设项目支出绩效评价指标体系。绩效评价指标体系由三级指标构成，设置一级指标5个，二级指标12个，三级指标24个。具体指标体系详见表3-1：

表 3-1 2024 年山丹县县级足球场建设项目绩效评价指标体系（框架）

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标标杆值	权重
决策 (18分)	项目立项 (6)	实施依据充分性	充分	3
		实施程序规范性	规范	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	合理	3
		绩效指标明确性	明确	3
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	科学	3
		资金分配合理性	合理	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标标杆值	权重
过程 (21分)	资金管理 (6分)	资金到位率	=100%	3
		预算执行率	=100%	3
	组织实施 (15分)	管理制度健全性	健全	3
		实施方案完备性	有效	3
		实施方案执行有效性	规范	3
		合同管理完备性	完备	3
		项目验收规范性	规范	3
成本 (6分)	经济成本 (6分)	成本控制情况	≤200 万元	6
产出 (31分)	产出数量 (15分)	足球场建设数量	=1	5
		实际建设面积	=7140 m ²	5
		设施配套完成率	=100%	5
	产出质量 (8分)	竣工验收合格率	=100%	4
		材料质量合规性	=95%	4
	产出时效 (8分)	项目及时完工情况	及时	4
		项目验收及时性	及时	4
效益 (24分)	社会效益 (8分)	健身条件改善	改善	8
	可持续影响 (8分)	长效管理机制健全性	健全	8
	满意度 (8分)	群众满意度	≥90%	8
合计				100

(六) 评价人员组成

评价工作组由甘肃慧瑞融智管理咨询有限公司李进军、王腊梅、柳阳娇、韩丹丹、张洁、梁鹏 6 人组成。其中，

李进军为项目主评人，主要负责项目的总体协调，确定实施方案，计划安排。王腊梅为项目负责人，主要负责完成绩效评价过程中各环节成果物的终审以及项目进度管控工作；柳阳娇为项目经理，负责组织项目的具体实施；韩丹丹为咨询顾问，配合项目经理完成调研分析、资料研读、指标体系设置和数据分析等事项；张洁、梁鹏为咨询助理，负责做好项目的相关辅助工作。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施分为前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。具体实施过程如下。

1. 前期准备阶段

（1）开展前期调研

自行调研：通过信息公开平台、山丹县人民政府、山丹县文体广电和旅游局官网等多个渠道，收集梳理分析数据信息，提取与绩效评价有关的信息，对于被评价项目有比较清晰的认识，整理出相关问题。

现场调研：与山丹县文体广电和旅游局进行充分沟通，全面了解项目的立项依据、预算管理、资金拨付、组织实施与管理等情况，传达工作要点，并获取相关资料。

（2）绩效评价方案的确定

确定绩效评价方案，主要包括以下几部分内容：设置绩效评价指标体系、确定评价依据和评价方法、确定非现场评价和现场评价范围、编制调查问卷、确定资料收集清

单。评价方案经评价组内部审核之后进行评价实施工作。

2. 组织实施阶段

评价人员对山丹县文体广电和旅游局报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开数据资料与被评价单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

（1）非现场评价

评价组向山丹县文体广电和旅游局发送《资料收集清单》，收到提供的资料后，对资料进行整理，与各种公开数据资料进行比对，核实分析资料的真实性、完整性和有效性。

（2）现场评价

评价组根据评价方案确定的评价方式，到山丹县文体广电和旅游局开展现场评价。现场评价内容主要有以下 4 点：

①资料核查：对项目明细账、资金拨付凭证、相关合同、实施内容等资料进行核查。

②实地勘察：对建设项目进行实地勘察。

③分析评价：结合工作底稿、评价指标体系、工作记录等内容，全面梳理、汇总现场评价和非现场评价情况，进行综合评价分析。

（3）形成评价初步结论

通过整理完善工作底稿，综合分析现场评价和非现场评价的情况，回收满意度调查问卷，掌握服务对象对项目的真实看法，结合部门提供的资料，对调查数据进行科学筛选和深入分析，形成评价结论，发现问题并提出相关建议，形成绩效评价初步结论。

3. 形成报告阶段

（1）报告撰写

评价组根据收集、整理和汇总的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分（详见附件1），并对项目绩效情况进行综合分析评价，撰写绩效评价报告，形成评价报告初稿。

（2）报告论证

评价组召开论证会，对评价报告的完整性、逻辑性、合理性、充分性及所提意见建议的针对性、可操作性、可实现程度等提出内部意见，并根据内部意见修改完善报告。

（3）提交报告

绩效评价组组长于2025年8月25日前，将最终完成的项目绩效评价报告提交山丹县财政局。

四、评价结论及分析

（一）评价结论

根据评价组设计的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、沟通、现场评价、资料研究等方式，对2024

年山丹县县级足球场建设项目进行客观评价，最终得分 90 分，评价结果为“优”。具体得分情况如表 4-1 和图 4-1 所示。

表 4-1 绩效评价指标得分情况汇总表

一级指标及分值	二级指标及分值	分值	得分	得分率
决策 (18 分)	小计	18	18	100%
	项目立项 (6 分)	3	3	100%
		3	3	100%
	绩效目标 (6 分)	3	3	100%
		3	3	100%
	资金投入 (6 分)	3	3	100%
		3	3	100%
过程 (21 分)	小计	21	15	71%
	资金管理 (6 分)	3	3	100%
		3	3	100%
	组织实施 (15 分)	3	3	100%
		3	0	0%
		3	0	0%
		3	3	100%
		3	3	100%
成本 (6 分)	小计	6	6	100%
	经济成本 (6 分)	6	6	100%
产出 (31 分)	小计	31	31	100%
	产出数量 (15 分)	5	5	100%
		5	5	100%
		5	5	100%
	产出质量 (8 分)	4	4	100%
		4	4	100%

一级指标及分值	二级指标及分值	分值	得分	得分率
	产出时效（8分）	4	4	100%
		4	4	100%
效益（24分）	小计	24	20	83.33%
	社会效益（8分）	8	8	100%
	可持续影响（8分）	8	4	50%
	满意度（8分）	8	8	100%
合计		100	90	90%

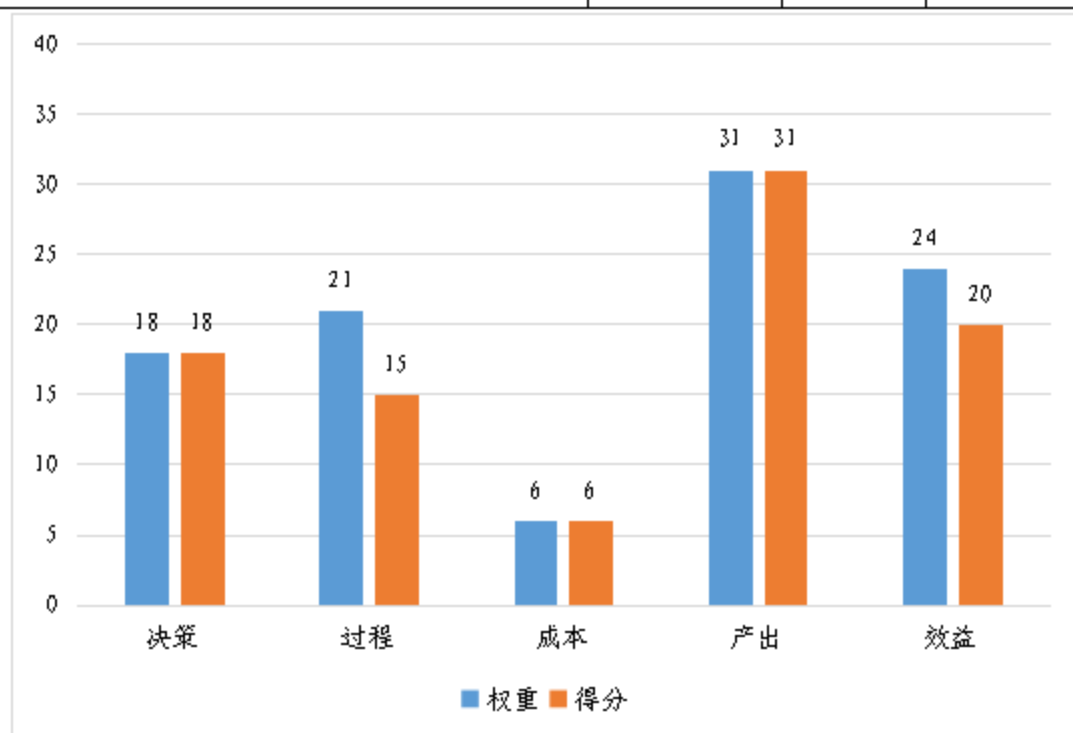


图 4-1 绩效评价指标得分情况

（二）综合评价情况分析

通过现场评价与非现场评价相结合的方式进行全面分析，山丹县县级足球场建设项目立项依据充分、立项程序、资金使用规范，按计划完成了足球场建设核心任务，项目实施效益相对明显。但项目实施过程中也存在不足：一是项目未制定实施方案，执行环节缺少指引；二是临时管理

维护制度缺失

五、绩效评价指标分析

本次评价从决策、过程、成本、产出、效益 5 个维度综合分析，评价 2024 年山丹县县级足球场建设项目的绩效情况。5 个一级指标之下包含 12 个二级指标和 24 个三级指标。具体指标分析如下。

（一）项目决策情况

项目决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，指标分值 18 分，评价得分 18 分。具体三级指标得分情况如表 5-1 所示：

表 5-1 项目决策指标得分情况表

二级指标及分值	三级指标	指标标杆值	业绩值	权重	得分
项目立项 (6 分)	实施依据充分性	充分	100%	3	3
	实施程序规范性	规范	100%	3	3
绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	合理	100%	3	3
	绩效指标明确性	明确	100%	3	3
资金投入 (6 分)	预算编制科学性	科学	100%	3	3
	资金分配合理性	合理	100%	3	3
合计			100%	18	18

1. 项目立项

（1）实施依据充分性

经评价，山丹县县级足球场建设项目的实施具备充分的合规性与必要性。从政策依据来看，项目实施严格遵循《甘肃省财政厅关于下达 2023 年全民健身设施补短板工程

第二批中央基建投资预算的通知》（甘财建〔2023〕161号）中“补齐全民健身设施短板、提升公共体育服务能力”的专项政策要求，符合国家、省级层面体育事业发展导向；从部门履职角度而言，依据山丹县文体广电和旅游局公共体育服务职能定位，该项目是其推进县域公共体育设施建设、满足群众健身需求的必要举措，且项目聚焦县域标准化足球场地空白问题，与其他体育设施项目不存在重复建设情况；从财政支持适配性来讲，项目以新建标准化足球场及配套设施、完善公共体育服务体系为核心目标，既契合公共财政对民生领域的支持范围，也符合中央基建投资向基层公共服务设施倾斜、中央与地方事权支出责任划分的原则，中央拨付的240万元专项资金与项目建设需求精准匹配。

该指标权重分3分，根据评分标准得3分。

（2）实施程序规范性

经评价，该项目严格遵循规范程序开展审批与实施工作。依据国家及省级关于全民健身设施建设的相关要求，项目实施前完成全流程审批、在资金使用与项目执行环节，严格按照文件要求，明确资金用途、使用范围及管理规范，有序推进工程计量与工程款支付，同步落实国库集中支付制度；项目竣工后联合验收，实施全过程符合政策规定、审批流程及管理制度要求。

该指标权重分3分，根据评分标准得3分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

经评价，该项目绩效目标设定科学合理。产出指标明确建设数量、质量、时效及成本要求；效益指标覆盖经济、社会、生态及可持续影响，维度清晰；满意度指标量化使用人群要求。各指标可衡量、贴合项目，与内容和预算匹配，符合合理性要求。

该指标权重分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 绩效指标明确性

经评价，该项目围绕“新建 1 块标准 11 人制草坪足球场、补齐公共体育设施短板”的总体目标，将绩效指标细化分解为具体可衡量的内容：在产出指标上，数量明确建设 1 块健身场地，质量设定场地完成率、设施竣工验收合格率 $\geq 100\%$ ，时效规定建设工程完成及时性 $\geq 98\%$ ，成本明确控制在预算范围内；在效益指标上，涵盖体育消费拉动、群众健身需求满足等方向；在满意度指标上，设定使用人群满意度 $\geq 90\%$ 。这些指标与项目建设任务、预期效果相对应，清晰且可衡量，符合绩效指标明确性的要求。

该指标权重分 3 分，根据评分标准得 3 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

经核查，该项目预算额度测算依据充分，均按照相关标准编制，预算内容与足球场建设（含主体工程、配套设

施及前期服务)内容相匹配,预算确定的240万元项目资金量与足球场建设工作任务相匹配,符合预算编制科学性要求。

该指标权重分3分,根据评分标准得3分。

(2) 资金分配合理性

经核查,该项目在资金分配时,根据《甘肃省财政厅关于下达2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算的通知》(甘财建〔2023〕161号)文件要求执行,预算资金分配依据充分。资金主要分配项目核心环节,分配额度与各环节建设需求、工程量及市场造价相匹配,且贴合项目实际建设规模与实施内容,资金分配合理且与项目实际相适应。

该指标权重分3分,根据评分标准得3分。

(二) 项目过程情况

项目过程指标包括资金管理、组织实施2个二级指标,指标分值21分,评价得分15分。具体三级指标得分情况如表5-2所示:

表 5-2 项目过程指标得分情况表

二级指标及 分值	三级指标	指标标杆值	业绩值	权重	得分
资金管理 (6分)	资金到位率	=100%	100%	3	3
	预算执行率	=100%	100%	3	3
组织实施 (18分)	项目管理制度健全性	健全	100%	3	3
	实施方案完备性	完备	0%	3	0
	实施方案执行有效性	有效	0%	3	0

二级指标及分值	三级指标	指标标杆值	业绩值	权重	得分
	合同管理完备性	完备	100%	3	3
	项目验收规范性	规范	100%	3	3
合计			71.43%	21	15

1. 资金管理

(1) 资金到位率

经核查，依据《甘肃省财政厅关于下达 2023 年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算的通知》（甘财建〔2023〕161 号），下达山丹县县级足球场建设项目中央基建投资资金 240 万元，本项目实际到位资金 240 万元，总体资金到位率为 100%。

该指标权重分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 预算执行率

经核查，项目明细账、国库集中支付凭证等资料，项目预算总额 240 万元，预算执行率为 100%。符合项目资金管理相关规定。

该指标权重分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(3) 资金使用合规性

经核查，该项目资金使用符合相关财务管理制度及专项资金管理规定，具备合规性。从资金用途来看，项目资金来源于《甘肃省财政厅关于下达 2023 年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算的通知》（甘财建〔2023〕161 号）明确的中央基建投资资金，实际支出全部用于县级

足球场建设相关事项，包括足球场主体工程款支付、配套设施建设费、勘察费、施工图审查费、监理费等，与预算批复及招标代理、勘察、施工、监理等合同约定的用途一致，未发现截留、挤占、挪用或虚列支出等情况，符合资金使用合规性的评价要求。

该指标权重分 3 分，根据评分标准得 3 分。

2. 组织实施

（1）项目管理制度健全性

经核查，2024 年山丹县县级足球场建设项目已建立《项目管理制度》《财务管理制度》《项目资金管理办法》等管理制度，并且遵照《中华人民共和国预算法》、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等文件的规定，对项目实施进行监管，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

该指标权重分 3 分，根据评分标准得 3 分。

（2）实施方案完备性

经核查，该项目未制定专门的实施方案，仅依托《山丹县县级足球场建设项目初步设计》推进项目实施，虽初步设计能为项目规范推进提供一定指引，但存在明显不足：一是缺乏项目实施全流程的统筹规划，初步设计未明确项目各阶段的具体进度安排与时间节点；二是责任分工不够细化，仅明确建设与设计单位主体角色，未划分项目实施各环节的具体责任部门与人员；三是未涵盖项目风险应对

措施，针对施工期间可能出现的扬尘、噪声污染管控，以及工程延期、成本超支等潜在风险，初步设计未提及具体应对预案，扣 3 分。

该指标权重分 3 分，根据评分标准得 0 分。

（3）实施方案执行有效性

经评价组核查，由于该项目未制定专门实施方案，仅依托《山丹县县级足球场建设项目初步设计》推进，导致项目在具体推进中缺乏明确的阶段划分、细化的责任分工及清晰的进度安排，扣 3 分。

该指标权重分 3 分，根据评分标准得 0 分。

（4）合同管理完备性

经核查，山丹县文体广电和旅游局提供的中标通知书、施工图设计文件审查合同书等合同资料，合同资料均有明确、清晰、完整的质量（验收）标准、交付要求、付款方式、售后服务保障及合同违约责任等内容。

该指标权重分 3 分，根据评分标准得 3 分。

（5）项目验收规范性

经核查，该项目验收过程中，资料核查完整，具备全套验收相关材料，各报告均明确标注工程质量符合设计及规范要求，现场勘查与实测实量工作规范开展，验收内容涵盖工程资料验收、现场实体验收及分部工程验收，且明确按标准执行；同时，形成了正式的验收报告，验收记录均有建设、施工、监理、勘察、设计五方参建单位签字盖

章确认，对于施工过程中曾存在的问题（如工程联系单提及的路灯未安装事宜）已明确处理方案，整体验收环节流程合规、资料完整、参与方权责清晰，规范性符合项目验收要求。

该指标权重分 3 分，根据评分标准得 3 分。

（三）项目成本情况

项目成本指标包括经济成本 1 个二级指标，指标分值 6 分，评价得分 6 分。具体三级指标得分情况如表 5-3 所示：

二级指标及分值	三级指标	指标标杆值	业绩值	权重	得分
经济成本（6 分）	成本控制情况	≤240 万元	≤240 万元	6	6
合计			100%	6	6

1. 经济成本

（1）成本控制情况

经核查，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年山丹县县级足球场建设项目资金已全额到位，全年实际支出 240 万元。经核查，各项资金支出未超出预算范围。

根据评分标准，该指标分值 6 分，评价得分 6 分。

（四）项目产出情况

项目产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标，指标分值 31 分，评价得分 31 分。具体三级指标得分情况如表 5-4 所示：

表 5-4 项目产出指标得分情况表

二级指标及分值	三级指标	指标标杆值	业绩值	权重	得分
产出数量	足球场建设数量	=1 个	1	5	5

二级指标及分值	三级指标	指标标杆值	业绩值	权重	得分
(15分)	实际建设面积	=7140 m ²	7140 m ²	5	5
	设施配套完成率	=100%	100%	5	5
产出质量 (8分)	竣工验收合格率	=100%	100%	4	4
	材料质量合规性	=95%	95%	4	4
产出时效 (8分)	项目及时完工情况	及时	100%	4	4
	项目验收及时性	及时	100%	4	4
合计			100%	31	31

1. 产出数量

(1) 足球场建设数量

经核查，项目按文件规划要求推进建设，已在规定期限内建成1个标准11人制草坪足球场，经建设、施工、监理、勘察、设计五方验收合格，符合规划建设要求。

根据评分标准，该指标分值5分，评价得分5分。

(2) 实际建设面积

经核查，项目按规划要求建设，实际建成的标准11人制草坪足球场占地面积为7140 m²，与文件规划的建设面积一致，且该面积已通过建设、施工、监理等五方验收确认，符合项目设计及规划要求。

根据评分标准，该指标分值5分，评价得分5分。

(3) 设施配套完成率

经核查，项目按文件规划要求推进配套设施建设，足球场相关配套设施已全部安装到位，其中高杆灯因高压线安全距离问题未安装，非配套设施缺失。且经建设、施工、

监理等五方验收合格，设施配套完成率达 100%，符合规划要求。

根据评分标准，该指标分值 5 分，评价得分 5 分。

2. 产出质量

(1) 竣工验收合格率

经核查，项目验收程序规范，建设单位组织施工、监理、勘察、设计五方开展验收，各参建单位出具质量检查报告，均确认工程符合设计及规范要求，最终验收结论为合格，竣工验收合格率达 100%。

根据评分标准，该指标分值 4 分，评价得分 4 分。

(2) 材料质量合规性

经核查，项目所用水泥、钢筋、HDPE 双壁波纹管、人造草等材料，均查验合格证与质保单，且按规定见证取样送检，检测报告显示各项指标符合设计及规范要求；监理单位全程监督材料进场验收，杜绝不合格材料使用，材料质量合规性达标。

根据评分标准，该指标分值 4 分，评价得分 4 分。

3. 产出时效

(1) 项目及时完工情况

经核查，项目按计划于 2024 年 4 月 12 日准时开工，2024 年 6 月 15 日完工，整体完工具备及时性，符合项目时间管理要求。

根据评分标准，该指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）项目验收及时性

经核查，项目完工后，建设单位随后组织施工、监理、勘察、设计五方，按规范流程开展验收，各参建单位出具验收报告并完成联合验收，完工后短期内完成验收，无验收拖延情况，验收具备及时性，符合项目验收管理要求。

根据评分标准，该指标分值4分，评价得分4分。

（五）项目效益情况

项目效益指标包括社会效益、可持续影响、服务对象满意度3个二级指标，指标分值24分，评价得分20分。具体三级指标得分情况如表5-4所示：

表5-4 项目效益指标得分情况表

二级指标及分值	三级指标	指标标杆值	业绩值	权重	得分
社会效益（8分）	健身条件改善	改善	100%	8	8
可持续影响（8分）	长效管理机制健全性	完善	100%	8	4
满意度（8分）	群众满意度	≥90%	90.86%	8	8
合计			83.33%	24	20

1. 社会效益

（1）健身条件改善

经核查，项目建成1个7140 m²标准11人制草坪足球场，满足群众足球运动健身需求；场地合规、设施完备，填补区域标准化足球健身场地空白，有效改善当地群众体育健身条件，符合全民健身设施补短板项目建设目标。

该指标权重分8分，根据评分标准得8分。

2. 可持续影响

(1) 长效管理机制健全性

经核查，该项目位于山丹县工业遗址主题公园，因公园暂未完成建设验收，暂未制定整体长效管理机制，但足球场作为已建成的公共体育设施，需优先及时设立临时管理维护制度。需明确临时管理责任主体，明确临时维护内容、临时开放规则，同时预留与后续公园整体管理机制的衔接空间，确保足球场在公园验收前可正常服务群众，避免因整体验收滞后导致设施闲置或运维缺失，考虑客观存在原因，扣 4 分。

该指标权重分 8 分，根据评分标准得 4 分。

2. 服务对象满意度

(1) 群众满意度

评价组根据项目实际情况设计群众的满意度调查问卷，通过线上问卷的形式随机发放，最终收到 93 份有效问卷。根据统计结果，群众对该项目的综合满意度为 90.86%，达到标杆值。

该指标权重分 8 分，根据评分标准得 8 分。

六、项目主要经验及做法

(一) 项目绩效目标编制贴合实际、重点突出

一是紧密结合项目定位，围绕“完善公共体育设施、服务群众健身需求”核心目标，匹配足球场建设规模、服

务人群、使用年限等实际建设内容，无脱离项目实际的虚设目标；二是**目标逻辑清晰**，从成本控制、建设质量、运营效益等维度分层设置目标，各目标间衔接顺畅，且表述简洁明了，便于后期绩效跟踪与评价，为项目规范推进、成果落地提供了明确指引。

（二）工程建设规范达标

严格按规划完成 1 块标准 11 人制草坪足球场及配套设施建设，实际建设面积、材料质量符合相关标准，竣工验收合格率 100%，保障设施功能与使用安全，满足公共体育服务基础需求。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目未制定实施方案，执行环节缺少指引

经核查，山丹县县级足球场建设项目未按要求制定包含目标定位、实施步骤、责任分工、阶段划分及进度安排等核心内容的实施方案。该项目涉及场地建设、配套设施安装、材料采购、质量管控、验收组织等多个关键环节，因缺乏完备方案，项目推进失去基础指引，实施规范性与可控性不足。

（二）临时管理维护制度缺失

经核查，该项目位于山丹县工业遗址主题公园，因公园暂未完成建设验收，项目整体未制定长效管理机制。但

足球场已建成并具备使用条件，却未针对性建立临时管理维护制度，存在临时责任主体未明确、临时维护内容未规定、临时开放规则未制定的问题，且未预留与后续公园整体管理机制的衔接接口，易导致足球场运维缺失、使用无序，影响公共服务功能发挥。

八、相关建议

（一）补全项目实施方案相关材料，建立方案管控与长效预防机制

针对山丹县县级足球场建设项目未制定实施方案，导致执行无指引、进度与环节管控存在风险的问题，一是建议建设单位牵头，联合施工、监理、勘察、设计等参建单位，梳理项目已完成的场地建设、材料采购、质量验收等实际流程，追溯各环节的执行细节，明确无方案情况下易出现的衔接漏洞与管控盲区，形成“无方案实施问题台账”，详细记录问题表现、影响及改进方向，为后续同类体育场地项目提供参考依据；二是建议建设单位对照项目规划要求，对项目实际建设成果及资金使用情况开展专项复盘评估；同时完善县域基建项目管理制度，明确要求今后新建体育场地、公共设施类项目，必须在开工前制定包含目标定位、实施步骤、责任分工、进度安排及管控标准的完整实施方案，方案需经建设、监理、设计单位联合审核通过后方可实施，并将方案执行情况与项目绩效评价挂钩，从

制度层面杜绝“无方案施工”“边实施边规划”的情况，保障项目规范高效推进。

（二）制定足球场临时维护与公园衔接方案

该项目位于山丹县工业遗址主题公园、公园未验收导致未制定整体管理机制的情况，建议优先由山丹县文体广电和旅游局牵头，联合公园建设单位，为足球场单独建立临时管理维护制度：明确临时管理责任主体，界定临时维护内容，规范临时开放规则；同时在临时制度中预留与后续公园整体管理机制的衔接条款，待公园验收后，可平稳过渡至公园统一管理体系，避免因管理断层导致足球场运维缺失，保障其持续服务群众健身需求。

九、需要说明的问题

无。

附件 1：项目支出绩效评价评分表

2024 年山丹县县级足球场建设项目支出绩效评价评分表

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	权重	指标标 杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据
决策 (18 分)	项目立项 (6)	实施依据 充分性	3	充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤政策覆盖范围是否符合规定；⑥项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的 1/6。	100%	3	项目资金分配、下达文件。
		实施程序 规范性	3	规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考	评价要点：①项目按照规定的程序申请设立；②申报、审批文件、材料、流程是否符合相关要求；③事前已经过集体决策。	100%	3	项目资金分配、下达文件。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	权重	指标标 杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据
					核项目立项的 规范情况。	符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的1/3。			
	绩效目标 (6分)	绩效目标 合理性	3	合理	项目所设定的 绩效目标是否 依据充分，是 否符合客观实 际，用以反映 和考核项目绩 效目标与项目 实施的相符情 况。	评价要点： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内 容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符 合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目资金量相 匹配。 符合所有评价要点得满分；若不 符合要点①的要求，该项指标直 接得0分；在符合要点①的基础 上②③④每出现一项不符合要 求扣权重分的1/4。	100%	3	绩效目 标申报 表。
		绩效指标 明确性	3	明确	依据绩效目标 设定的绩效指 标是否清晰、 细化、可衡量 等，用以反映 和考核项目绩	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标 值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计	100%	3	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据
					效目标的明细化情况。	划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要素各占 1/4 权重分。			
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	科学	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的 1/4。	100%	3	编制依据文件及预算编制明细表。
		资金分配合理性	3	合理	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科	评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的 1/2。	100%	3	项目资金分配、下达文件。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	权重	指标标 杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据
					性、合理性情 况。				
过程 (21分)	资金管理 (6分)	资金到位 率	3	=100%	实际到位资金 与预算资金的 比率,用以反 映和考核资金 落实及时情况 对项目实施的 总体保障程 度。	资金到位率=(实际到位资金/预 算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年 度或项目期)内按计划时点落实 到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或 项目期)内预算安排到具体项目 的资金。 该项分值=资金到位率×权重	100%	3	预算批 复文件、 配套资 金下达 文件。
		预算执行 率	3	=100%	项目预算资金 是否按照计划 执行,用以反 映或考核项目 预算执行情 况。	预算执行率=(实际支出资金/实 际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年 度或项目期)内项目实际拨付的 资金。 实际到位资金:一定时期(本年 度或项目期)内落实到具体项目 的资金。 该项分值=预算执行率×权重	100%	3	各资金 使用单 位的记 账凭证、 收支明 细账、决 算等资 料。
	组织实施 (15分)	管理制度 健全性	3	健全	项目实施单位 的财务和业务	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和	100%	3	预算批 复文件、

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据
					管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 符合所有评价要点得满分;每出现一项不符合要求扣权重分的1/2。			配套资金下达文件。
		实施方案完备性	3	有效	衡量项目实施 方案是否涵盖项目开展所需的全部关键要素,以保障项目从启动到结束的各个环节都有清晰指引,确保项目资源合理配置、目标顺利达成。主要考察实施方案是否包含明确的目标定位、详	评价要点: ①实施方案包含明确的目标定位,清晰阐述项目预期达成的成果和效益; ②实施方案具备详细的实施步骤,对项目各阶段具体操作流程有明确说明; ③实施方案有清晰的责任分工,明确各参与方在项目中的职责和任务; ④实施方案进行合理的阶段划分,将项目过程划分为可管理的不同阶段; ⑤实施方案制定科学的进度安排,明确各阶段的时间节点和整	0%	0	预算批复文件、配套资金下达文件。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据
					细的实施步骤、清晰的责任分工、合理的阶段划分及科学的进度安排等核心内容。	体工期。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的1/4。			
		实施方案执行有效性	3	规范	反映项目在实际实施过程中对既定实施方案的遵循程度和执行效果，评估实施方案是否在实际项目推进中发挥有效指导作用，保障项目按计划、高质量完成。主要考察是否按照方案确定的步骤、责任和进度开	评价要点： ①严格按照实施方案确定的步骤开展项目工作，无擅自更改或遗漏步骤情况； ②各参与方严格落实实施方案中的责任分工，无责任推诿现象； ③项目进度符合实施方案中的进度安排，未出现明显延误； ④实施方案的执行有效促进项目目标的实现，项目目标达成度符合预期。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的1/4。	0%	0	预算批复文件、配套资金下达文件。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据
					展工作，以及方案执行对项目目标实现的促进作用。				
		合同管理 完备性	3	完备	反映项目相关合同的签订、条款内容及履约过程的规范与完整程度。	评价要点： ①合同条款明确，包含标的、金额、期限、权利义务等核心要素； ②合同签订程序合规，经双方签字盖章并归档； ③履约记录完整，变更及违约处理手续齐全； 符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣权重分的1/3。	100%	3	预算批复文件、配套资金下达文件。
		项目验收 规范性	3	规范	考察项目验收的程序、依据和结果是否符合规定，用以反映验收工作的合规性。	评价要点： ①验收程序合规，成立验收组并按规定流程开展验收； ②验收依据充分，对照实施方案、合同等进行核查； ③验收结果明确，形成验收报告并注明合格或整改要求； 符合所有评价要点得满分，每出	100%	3	验收资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据
						现一项不符合要求扣权重分的1/3。			
成本（6分）	经济成本（6分）	成本控制情况	6	≤240万元	用于衡量山丹县县级足球场建设项目在实施过程中，实际成本与预算成本的控制程度，反映项目成本管理的有效性，以考核项目成本控制的执行情况。	评价要点：①成本预算编制符合项目实际需求和市场价格水平；②项目实施过程中成本变更有合理依据和规范审批流程；③实际成本与预算成本偏差在合理范围内（如偏差率不超过[X]%）；④成本控制措施有效，未出现因成本失控导致项目质量、进度受影响的情况。符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣权重分的1/3。	≤240万元	6	各资金使用单位的记账凭证、收支明细账、决算等资料。
产出（31分）	产出数量（15分）	足球场建设数量	5	=1	反映山丹县县级足球场建设项目实际完成的足球场数量，用于考核项目是否按规划完成建设任务，体现项目	评价要点：①建设数量与项目立项、可行性研究报告、初步设计等文件中规划的足球场数量一致；②若有数量变更，变更程序合规，且变更后数量仍符合公共体育设施补短板等相关政策要求；③实际建成足球场数量达到预期规划数量的比例为100%	1	5	各资金使用单位的记账凭证、收支明细账、决算等资料。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	权重	指标标 杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据
					建设规模的达成情况。	(或根据合理变更情况设定对应达标比例)。 符合所有评价要点得满分,每出现一项不符合要求扣权重分的1/3。			
		实际建设 面积	5	=7140 m ²	体现山丹县县级足球场建设项目实际建成的足球场及相关设施的面积规模,用于考核项目建设面积是否按规划落实,反映项目建设规模的执行情况。	评价要点:①实际建设面积与项目立项、初步设计等文件中规划的面积偏差在合理范围内(如偏差率不超过[X]%) ;②面积测量依据规范,数据准确;③若有面积变更,变更有合理原因(如根据场地实际条件优化调整)且经过合规审批,变更后面积仍符合相关建设标准和使用需求。符合所有评价要点得满分,每出现一项不符合要求扣权重分的1/3。	7140 m ²	5	各资金使用单位的记账凭证、收支明细账、决算等资料。
		设施配套 完成率	5	=100%	反映山丹县县级足球场建设项目中,如排水沟、检查井、照明系统、附	评价要点:①配套设施完成数量、类型与项目初步设计、工程量清单等规划文件一致;②配套设施质量符合相关工程建设标准;③配套设施与足球场主体工	100%	5	各资金使用单位的记账凭证、收支明

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据
					属用房等配套设施的实际完成状况，用于考核项目配套设施是否按规划全部建成，保障足球场正常使用功能。	程同步建成、同步投入使用；④若有配套设施变更，变更程序合规，且变更后仍能满足足球场及周边使用需求。 符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣权重分的1/3。			细账、决算等资料。
	产出质量 (8分)	竣工验收合格率	4	=100%	体现山丹县县级足球场建设项目完工后，通过竣工验收的合格程度，用于考核项目工程质量是否达到相关标准要求，反映项目建设质量的最终成果。	评价要点：①项目所有分部工程、单位工程均通过验收，且验收结论为合格；②竣工验收程序规范，参与验收单位及人员具备相应资质和资格；③验收过程中发现的问题已全部整改完毕，且整改结果符合要求；④竣工验收合格率达到100%（或根据合理误差设定达标要求，一般应为100%）。 符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣权重分的1/4。	100%	4	竣工验收报告

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据
		材料质量合规性	4	=95%	用于考核山丹县县级足球场建设项目所用的人工草坪、混凝土、照明设备等各类材料的质量是否符合国家法律法规、相关标准及项目设计文件要求，保障项目质量和使用安全、环保等性能。	评价要点：①材料质量符合国家相关产品质量标准、环保标准等；②材料进场时有完整的检验报告、合格证书等质量证明文件；③材料实际使用情况与设计文件中对材料质量、性能的要求一致；④材料抽样检验合格率达到100%，未出现因材料质量问题影响工程质量、使用功能及环保要求的情况。 符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣权重分的1/4。	100%	4	设备采购合同、验收单、实地考察
	产出时效（8分）	项目及时完工情况	4	及时	考核项目是否在预定的计划工期内完成全部建设内容，体现项目整体进度的把控能力，确保项目	评价要点： ①项目在计划完工时间节点前启动收尾工作，做好交付准备； ②项目所有建设任务在计划工期内全部完成，无遗留工程； ③项目完成后及时进行内部自检，确保质量符合交付要求；	100%	4	设备采购合同、验收单、实地考察

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据
					能够按时交付并投入使用，避免因工期延误带来的额外成本和影响。	④按规定流程在计划完工时间内完成项目交付手续。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的1/4。			
		项目验收及时性	4	及时	评估项目在完工后是否及时启动验收程序，并在规定时间内完成验收工作，保障项目能够尽快通过验收并正式投入使用，提高项目交付效率。	评价要点： ①项目完工后，在规定时间内提交验收申请，启动验收程序； ②验收过程中，各相关方按规定时间节点提供验收所需资料； ③在规定的验收期限内完成所有验收环节，无拖延情况； ④对验收过程中发现的问题及时整改，在规定时间内完成整改并通过复验。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的1/4。	100%	4	验收单、实地考察
效益 (24分)	社会效益 (8分)	健身条件改善	8	改善	体现山丹县县级足球场建设项目建成后，对周边群众参	评价要点：①项目建成前周边足球及相关体育健身设施匮乏程度与建成后设施完善程度对比，有明显改善；②群众参与足球等	100%	8	满意度调查问卷

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	权重	指标标 杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据
					与足球运动及体育健身的条件提升程度，用于考核项目在改善公共体育设施、促进全民健身方面的实际效果。	体育健身活动的便利性、舒适性显著提升；③因足球场建成，周边群众体育健身活动的频率、时长等有积极变化（可通过问卷调查、数据统计等方式验证）；④足球场及配套设施的建设标准、使用功能等符合群众健身需求和相关体育设施建设规范。符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣权重分的1/4。			
	可持续影响 (8分)	长效管理机制健全性	8	健全	考察项目是否建立了完善的长效管理机制，以保障项目在交付使用后能够持续稳定运行、维护和发展，充分发挥项目的长期效益，包括后续的运营维	评价要点： ①建立涵盖运营维护、设备保养、人员管理等关键方面的长效管理机制； ②长效管理机制内容详细、具体，对各项管理工作有明确操作流程； ③长效管理机制具备可操作性，能够在实际管理工作中有效执行； ④建立长效管理机制的监督和	50%	4	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据
					护、设备保养、人员管理等方面的制度和措施。	调整机制，确保机制持续适应项目发展需求。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的1/4。			
	满意度（8分）	群众满意度	8	≥90%	体现山丹县县级足球场建设项目从建设过程到建成使用后，周边群众及相关使用者对项目的满意程度，用于考核项目在满足群众体育需求、提升公共服务质量等方面的实际效果，反映项目的社会效益和公众认可程度。	评价要点：①通过合理有效的调查方式（如问卷调查、现场访谈等）获取群众反馈；②群众满意度达到一定比例（如满意度不低于[X]%）；③群众反映的问题（如建设过程影响、设施使用体验等）得到合理回应和解决；④群众对足球场的建设质量、使用功能、服务配套等方面的认可程度符合项目预期目标。 符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣权重分的1/4。	90.86%	8	满意度调查问卷

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	权重	指标标 杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据
合计			100	得分			90%	90	—

附件 2：项目问题清单

项目支出绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目过程方面存在的问题	1	山丹县文体广电和旅游局	经评价组核查，山丹县县级足球场建设项目未按要求制定包含目标定位、实施步骤、责任分工、阶段划分及进度安排等核心内容的实施方案。该项目涉及场地建设、配套设施安装、材料采购、质量管控、验收组织等多个关键环节，因缺乏完备方案，项目推进失去基础指引，实施规范性与可控性不足。
项目效益方面存在的问题	2		经核查，该项目位于山丹县工业遗址主题公园，因公园暂未完成建设验收，项目整体未制定长效管理机制。但足球场已建成并具备使用条件，却未针对性建立临时管理维护制度，存在临时责任主体未明确、临时维护内容未规定、临时开放规则未制定的问题，且未预留与后续公园整体管理机制的衔接接口，易导致足球场运维缺失、使用无序，影响公共服务功能发挥。

附件 3：满意度调查问卷

（一）调查目的及对象

为为更加深入了解山丹县县级足球场建设项目的实施效果，评价组设计了群众满意度调查问卷。问卷全面收集群众意见与看法。通过本次满意度调查，既能提炼项目在设施配置、使用体验等方面的问题，也能为后续项目优化提供参考依据，进一步提升项目服务质量与群众使用体验。

（二）调查问卷

2024 年山丹县县级足球场建设项目满意度调查问卷

一、基本信息

1.您的居住地是否在山丹县清泉镇及周边区域？

-□是

-□否

2.您是否使用过该足球场（包括参观、运动等）？

-□是（请继续作答）

-□否

二、基本问题

1.您了解该足球场的建设背景吗（如“全民健身设施补短板工程”政策支持）？

-□非常了解

-□了解一些

-□不了解

2.您主要通过什么渠道知晓该足球场的建设及开放信息?

- 政府公告
- 社区通知
- 社交媒体
- 亲友告知
- 其他 (请注明)

三、满意度问题

1.您对足球场的场地质量 (如人工草坪平整度、排水系统) 的满意度如何?

- A.非常满意
- B.比较满意
- C.基本满意
- D.不太满意
- E.非常不满意

2.您对足球场的配套设施 (如照明、休息区、标识牌) 的满意度如何?

- A.非常满意
- B.比较满意
- C.基本满意
- D.不太满意
- E.非常不满意

3.您认为该足球场的开放时间和使用便利性 (如交通可达性) 如何?

- A.非常满意
- B.比较满意
- C.基本满意
- D.不太满意
- E.非常不满意

4.您认为该足球场对丰富当地群众体育文化生活的作
用如何？

- A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意
- D.不太满意 E.非常不满意

5.综合来看，您对该足球场建设项目的整体满意度如何？

- A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意
- D.不太满意 E.非常不满意

感谢您的参与！

(三) 满意度调查问卷填报数据

1. 您对足球场的场地质量（如人工草坪平整度、排水系统）的满意度如何？		
选项	百分比%	小计
A. 非常满意	55.91%	52
B. 比较满意	40.86%	38
C. 一般	2.15%	2
D. 不太满意	1.08%	1
E. 非常不满意	0.00%	0
有效填写量		93
2. 您对足球场的配套设施（如照明、休息区、标识牌）的满意度如何？		
选项	百分比%	小计
A. 非常满意	56.99%	53
B. 比较满意	39.78%	37
C. 一般	3.23%	3
D. 不太满意	0.00%	0
E. 非常不满意	0.00%	0
有效填写量		93
3. 您认为该足球场的开放时间和使用便利性（如交通可达性）如何？		
选项	百分比%	小计
A. 非常满意	58.06%	54
B. 比较满意	38.71%	36
C. 一般	3.23%	3
D. 不太满意	0.00%	0
E. 非常不满意	0.00%	0
有效填写量		93
4. 您认为该足球场对丰富当地群众体育文化生活的的作用如何？		
选项	百分比%	小计
A. 非常满意	59.14%	55
B. 比较满意	38.71%	36

C. 一般	2.15%	2
D. 不太满意	0%	0
E. 非常不满意	0%	0
有效填写量		93
5. 综合来看，您对该足球场建设项目的整体满意度如何？		
选项	百分比%	小计
A. 非常满意	58.06%	54
B. 比较满意	40.86%	38
C. 一般	1.08%	1
D. 不太满意	0%	0
E. 非常不满意	0%	0
有效填写量		93

（四）满意度调查结果分析

满意度调查结果分析如下：

满意度问题 1：您对足球场的场地质量（如人工草坪平整度、排水系统）的满意度如何？

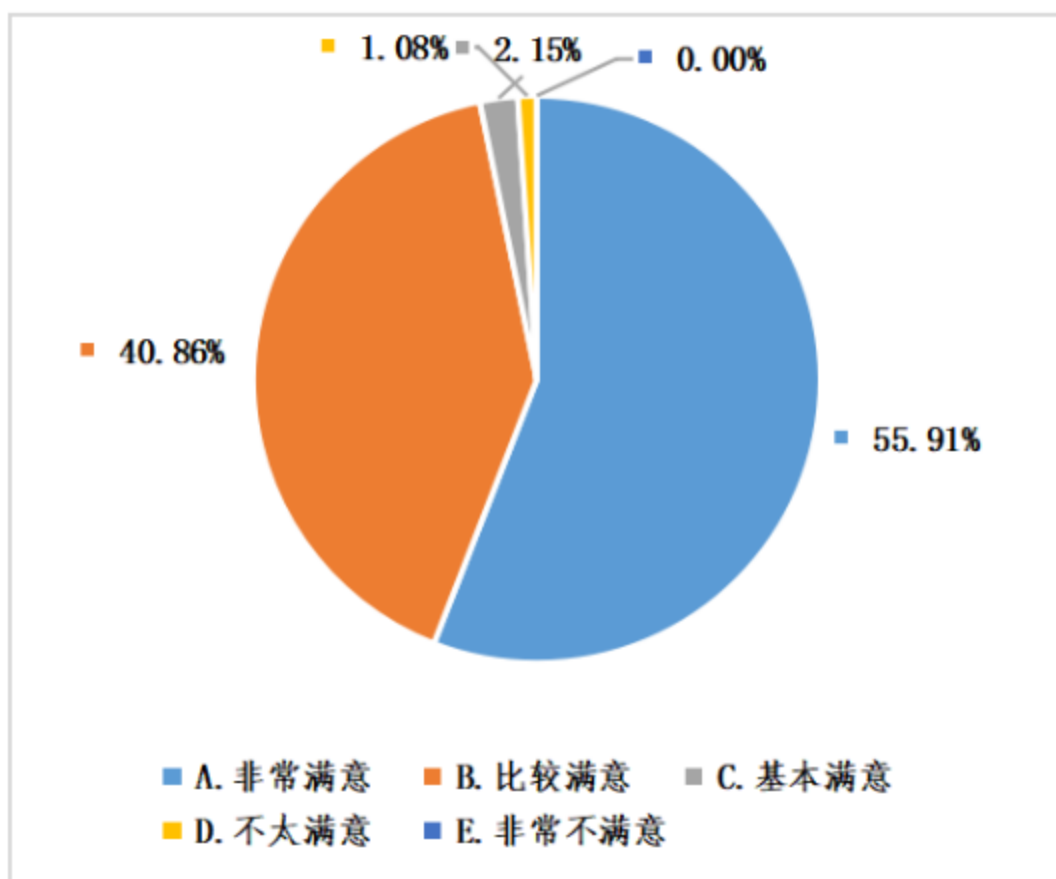


图 1 满意度问题 1 调查结果统计图

经过分析，在有效问卷中，群众对足球场的场地质量（如人工草坪平整度、排水系统）的满意度非常满意的占 55.91%，比较满意的占 40.86%，基本满意的占 1.08%，不太满意的占 0%，非常不满意的为 0%。经计算，群众对足球场的场地质量（如人工草坪平整度、排水系统）的满意度 90.32%。

满意度问题 2: 您对足球场的配套设施（如照明、休息区、标识牌）的满意度如何？

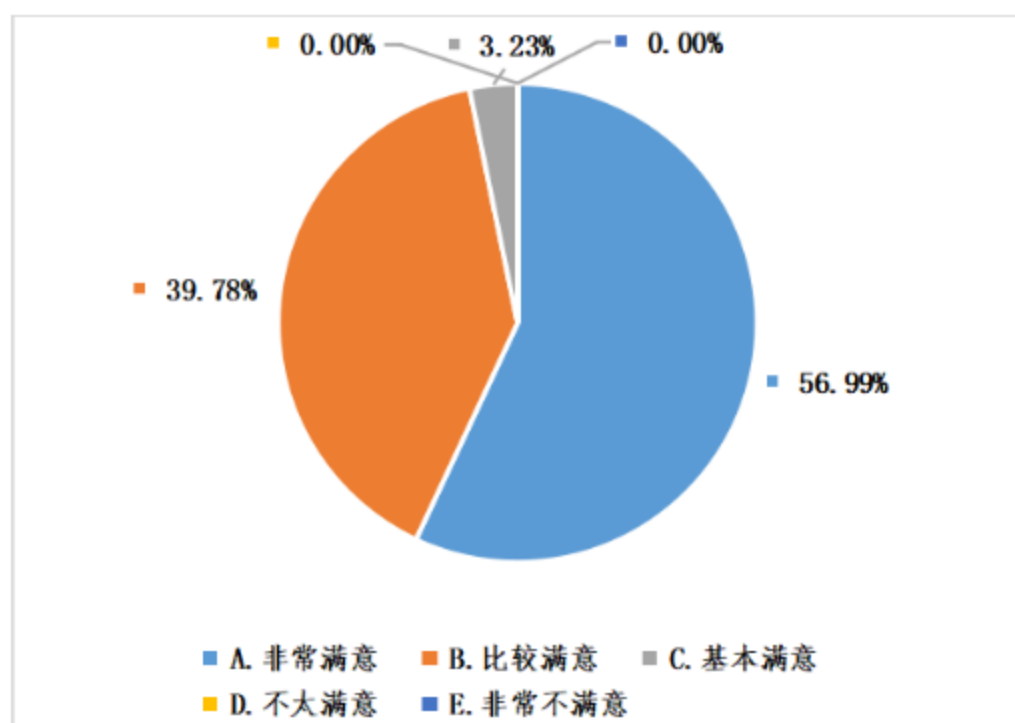


图 2 满意度问题 2 调查结果统计图

经过分析，在有效问卷中，群众对足球场的配套设施（如照明、休息区、标识牌）的满意度非常满意的占 56.99%，比较满意的占 39.78%，基本满意的占 3.23%，不太满意的占 0%，非常不满意的为 0%。经计算，群众对足球场的配套设施（如照明、休息区、标识牌）的满意度为 90.75%。

满意度问题 3: 您认为该足球场的开放时间和使用便利性（如交通可达性）如何？

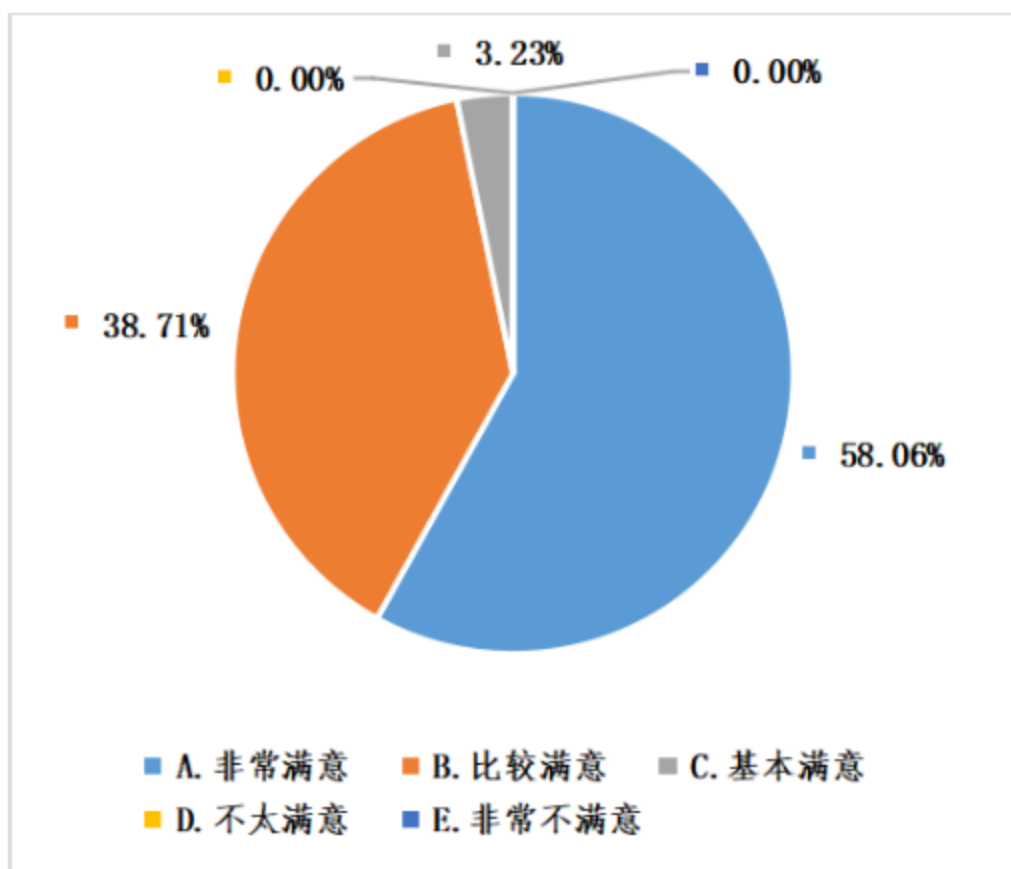


图 3 满意度问题 3 调查结果统计图

经过分析，在有效问卷中，群众对足球场的开放时间和使用便利性（如交通可达性）非常满意的占 58.06%，比较满意的占 38.71%，基本满意的占 3.23%，不太满意的占 0%，非常不满意的为 0%。经计算，群众对足球场的开放时间和使用便利性（如交通可达性）满意度为 90.97%。

满意度问题 4: 您认为该足球场对丰富当地群众体育文化生活的的作用如何？

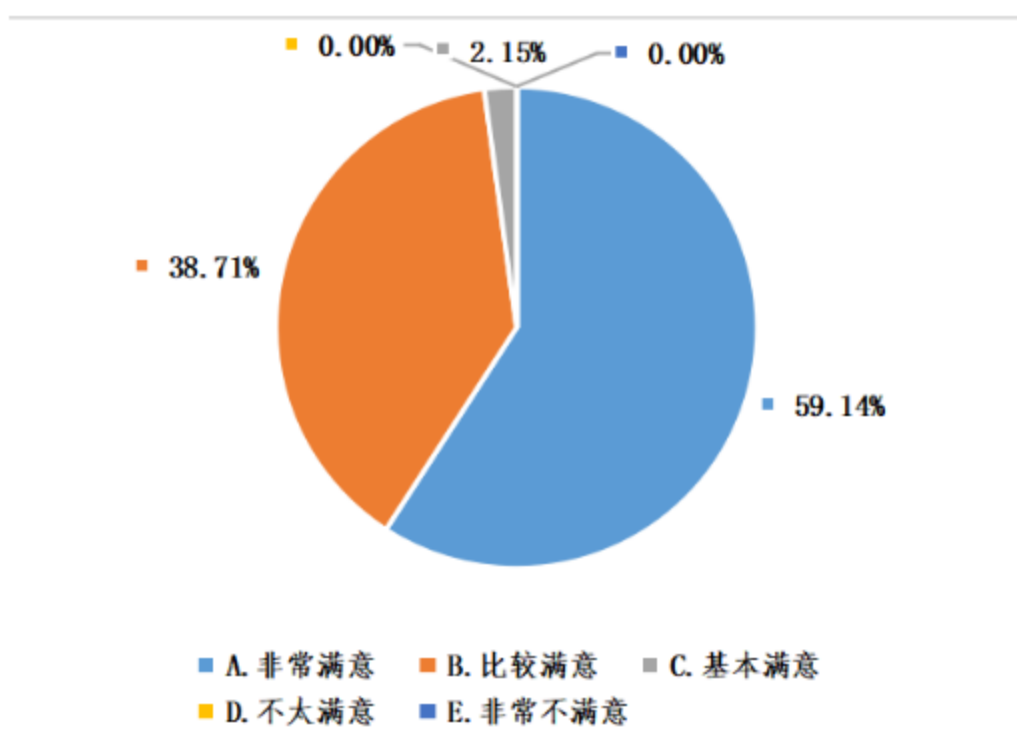


图 4 满意度问题 4 调查结果统计图

经过分析，在有效问卷中，综合来看，群众对足球场对丰富当地群众体育文化生活的作用非常满意的占 59.14%，比较满意的占 38.71%，基本满意的占 2.15%，不太满意的占 0%，非常不满意的为 0%。经计算，群众对足球场对丰富当地群众体育文化生活的作用满意度为 91.40%。

满意度问题 5: 综合来看，您对该足球场建设项目的整体满意度如何？

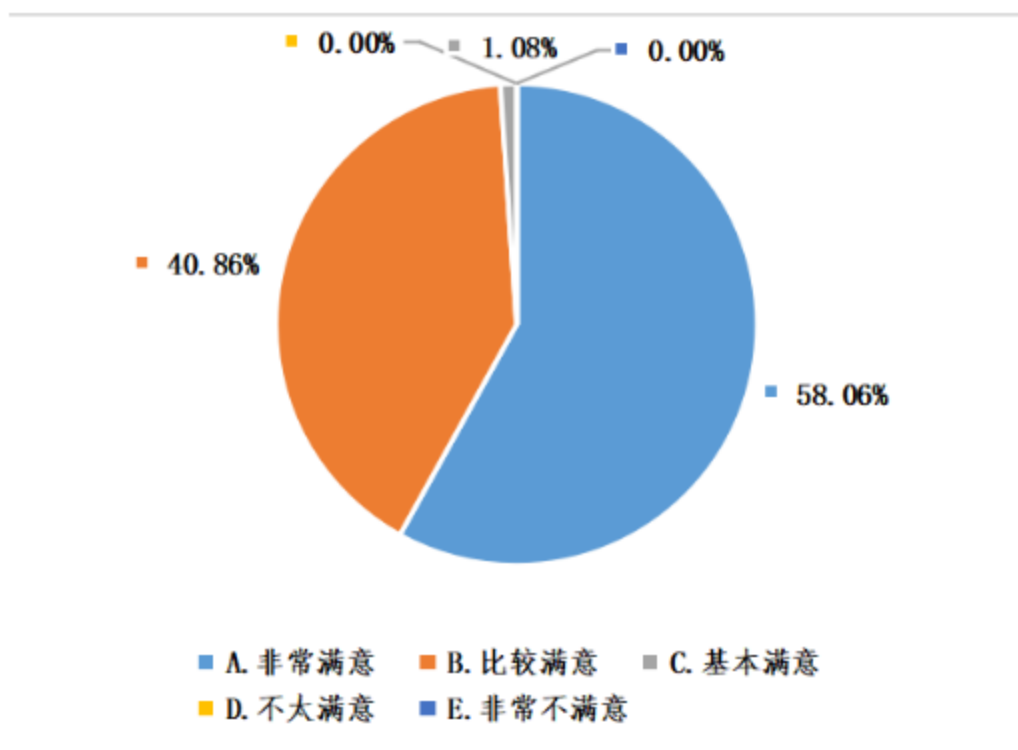


图 5 满意度问题 5 调查结果统计图

经过分析，在有效问卷中，综合来看，群众对该足球场建设项目的整体满意度非常满意的占 58.06%，比较满意的占 40.86%，基本满意的占 1.08%，不太满意的占 0%，非常不满意的为 0%。经计算，群众对该足球场建设项目的整体满意度为 91.40%。

综上所述，群众对项目在设施配置、使用体验等方面综合满意程度为 90.86%。
