老军乡易地扶贫搬迁安置点后续产业基地改造提升项目

绩效评价报告

项 目 名 称：老军乡易地扶贫搬迁安置点后续产业基地改造提升项目

项目主管单位：山丹县老军乡人民政府

评价委托单位：山丹县老军乡人民政府

评价机构名称：北京金财汇智管理咨询有限公司甘肃分公司

二〇二六年八月

老军乡易地扶贫搬迁安置点后续产业基地改造提升项目绩效评价结论表

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	老军乡易地扶贫搬迁安置点后续产业基地改造提升项目		
	评价年度	2025 年度	评价类型	事后评价
	委托评价单位	山丹县老军乡人民政府	评价机构名称	北京金财汇智管理咨询有限公司甘肃分公司
	评价对象名称	山丹县老军乡人民政府		
实施目的	为全面、客观、公正评价老军乡易地扶贫搬迁安置点后续产业基地改造提升项目实施成效，规范地方政府一般债券资金管理，提高财政资金使用效益，开展本次绩效评价工作。通过对安置点公共设施修缮、产业基地改造、管网及配套设施安装等内容的资金拨付、项目实施、工程质量、物资采购、绩效目标完成情况开展全流程评价，核实项目实际产出与综合效益。准确掌握项目在补齐安置点基础设施短板、改善搬迁群众生产生活条件、夯实产业增收基础、巩固易地搬迁后续扶持成果方面的实效，客观采集搬迁群众服务对象满意度。梳理项目实施经验，查找工程运维、绩效目标设置、运行监控、绩效自评等环节短板，为同类搬迁后续扶持项目的申报实施、预算安排、绩效管理提供参考依据，持续提升财政债券资金配置与使用效益。			
资金情况（万元）	预算安排资金	200	实际到位资金	194.01
	其中：市级财政		其中：市级财政	
	省级财政（一般债券资金）	200	省级财政（一般债券资金）	194.01
	实际支出资金	194.01	结转结余资金	
	预算执行率	100%		

二、绩效目标

总体绩效目标	以提升易地扶贫搬迁安置点后续发展能力为核心，依托县级地方政府一般债券资金，实施安置点公共服务设施修缮、产业基地大棚及灌溉管网等系统性改造工程，补齐安置点基础设施短板，全面改善安置点公共服务设施条件，夯实搬迁群众产业发展硬件基础，持续优化产业生产环境，切实提升搬迁群众生产生活保障水平与产业增收能力，巩固易地扶贫搬迁后续扶持成效，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、评价基本情况

评价范围	时间范围：2025 年 1 月—2025 年 12 月； 对象范围：老军乡易地扶贫搬迁安置点后续产业基地改造提升项目； 资金范围：200 万元。
评价依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）； 3.《中共甘肃省委 甘肃省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（甘发〔2018〕32 号）； 4.《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101 号）； 5.《甘肃省省级预算绩效管理办法》（甘财绩〔2020〕5 号）； 6.《甘肃省省级预算绩效目标和指标设置指引》（甘财绩〔2024〕7 号）； 7.2025 年项目事前绩效评估报告、实施方案、绩效目标申报表、监控表、自评表； 8.政府采购相关资料、项目资金凭证等其他相关资料。
评价办法	本次评价采用指标对比分析法、因素分析法、公众评判法对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行综合评价。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	**评价得分**	94.36 分		**评价等级**	优
绩效分析	**指标**	决策	过程	产出	效益
	得分率	94.17%	85.18%	100.00%	95.07%

五、存在问题

（一）绩效指标体系不完整，部分核心产出指标缺失

质量指标、时效指标三级指标覆盖不全面。质量指标仅设置“验收合格率 100%”，仅考核项目竣工验收是否合格，未针对工程实体质量、设施设备使用性能、大棚及管网等关键设施质量稳定性设置考核指标，对项目建成后设施好不好用、耐不耐用，绩效目标难以实现衡量与约束；时效指标仅设置“资金拨付及时率 100%”，只关注资金拨付进度，未设置工程按期完工、建设任务按时完成等核心时效指标，资金拨付及时不等于工程按期建成，无法真实反映项目实际建设推进时效。

（二）绩效运行监控研判不充分，风险预警纠偏作用未有效发挥

1-6 月绩效监控表中项目监控期资金执行数为 0 元，资金执行率为 0，但全部绩效指标完成目标可能性均直接判定为“确定能”，未结合资金零支出的现实情况开展偏差研判，偏差原因、拟改进措施栏目全部空白，未能客观如实反映项目阶段性实施状态；1-9 月绩效监控表仅留存表头，项目相关资金、绩效指标监控内容均未填报，未按要求完成 1-9 月监控工作。

六、有关对策建议

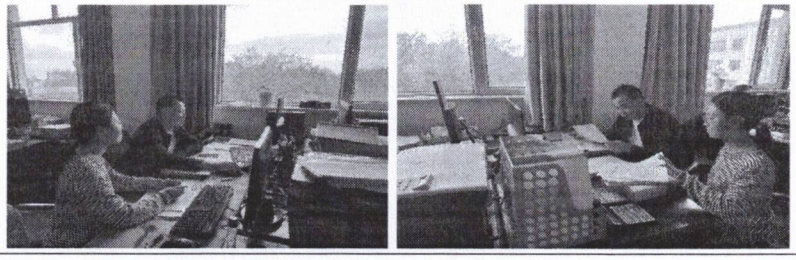
（一）科学完善绩效指标体系，夯实绩效管理源头基础

一是强化绩效目标源头管控，树立“绩效目标引领项目全周期管理”理念。在项目入库、预算编制环节，立足项目建设内容、功能定位科学构建指标体系，打破“重数量、轻质量，重资金、轻产出”的指标设置思维。补齐工程实体质量、关键设施运行稳定性等质量指标，兼顾工程建设质量与后期投用效能；增设工程完工时间等时效指标，从源头保障绩效目标可衡量、可监控、可评价，充分发挥绩效目标对项目实施的导向约束作用。

（二）压实绩效运行监控管理责任，做实动态预警纠偏机制

一是摒弃重填报、轻实效的形式化做法，严格落实两次绩效监控报送要求，完整填报资金执行、项目进度、偏差原因及整改措施。对资金执行滞后等异常情形，客观研判实施风险，杜绝简单判定“确定能完成”；二是强化监控结果运用，将监控发现问题用于项目、资金调度，建立监控－自评联动机制，实现目标设定、运行监控、年度自评、整改提升全流程闭环管理。

七、其他需要说明的事项

实地调研掠影	
主评人	王兴

八、评价指标体系

一级指标	二级指标
A.决策（18 分）	A1 项目立项（6 分）
	A2 绩效目标（6 分）
	A3 资金投入（6 分）

B. 过程（22 分）	B1 资金管理（11 分）
	B2 组织实施（11 分）
C. 产出（33 分）	C1 产出数量（12 分）
	C2 产出质量（9 分）
	C3 产出时效（8 分）
	C4 产出成本（4 分）
D. 效益（27 分）	D1 社会效益（13 分）
	D2 可持续影响（4 分）
	D3 满意度（10 分）

评价机构（盖章）：	评价工作组人员（签字）：
主评人（签字）：	程凤霞
评价日期：2026 年 8 月 3 日	评价日期：2026 年 8 月 3 日
